

Registreringsskema til test 2: Funktionsafprøvning af dagslysstyring, zoneopdeling og bevægelsesmeldere

Disse skemaer kan udskrives og benyttes

Anlægsnummer	Udført af:	Dato:
Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under		
Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget)		
Anvendt måleudstyr		
Type	Kalibreringsdato	

Måleresultater

Lokale	Skriv antal	Enhed
Længde		m
Bredde		m
Maksimal afstand mellem punkter i måleplan		m
Maksimal antal af punkter i måleplan		-

Zone	Målepunkter	Belysningsstyrke [Lux]
------	-------------	------------------------

Dagslysstyring og zoneopdeling

Tjek	Ja/Nej
Almenbelysning tænder automatisk, når belysningsstyrken er under $E_{\min}$ for lokale/zone	
Reguleringen fungerer jf. dokumentationen – konstateres for eksempel ved at trække gardiner for eller lukke solafskærmning	
Belysningen dæmpes mest i zoner med meget dagslys og mindre i zoner med mindre dagslys	
Ved maksimal dæmpning opfyldes kravene til belysningsstyrke	

3/5

Tjek	Tid [min]
Lyset slukkes efter t_{sluk} minutter	
Målt tidsforsinkelse (holdetid) t_{sluk} svarer til indstillingsværdi	

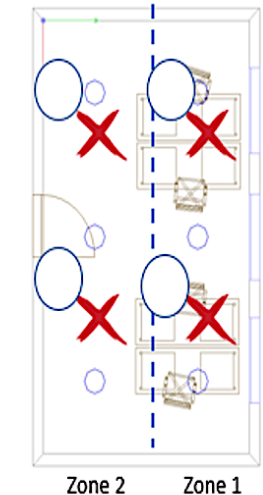
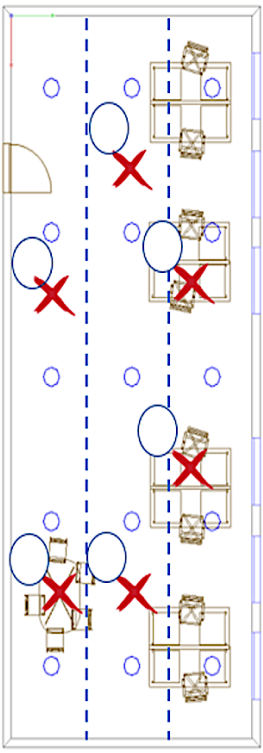
Det samlede resultat		
Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)?	Ja	Nej
Hvis nej – beskriv hvorfor		
Kommentarer		

Forslag til målepunkter

Typisk udlægning af målepunkter i forskellige typiske lokaliteter ses i nedenstående tabel:

- Gangareal (måling mellem hvert armatur)
- Kontor inkl. arbejdspladser (lille, stor og middel)
- Toilet (2 - 4 målinger, afhængig af arealet)
- Birum (2 - 4 målinger, afhængig af arealet)

Forslag til målepunkter ved målinger af belysningsstyrker		
Størrelse på rum	Antal målinger	Skitse
Lille rum: $\leq 15 \text{ m}^2$	2 målinger	Lille rum $\leq 15 \text{ m}^2$ Zone 2 Zone 1

Middel rum: $\leq 30 \text{ m}^2$	4 målinger	Middel rum $\leq 30 \text{ m}^2$  Zone 2 Zone 1
Stort rum: $\geq 30 \text{ m}^2$	Min. 6 målinger	Stort rum $\geq 30 \text{ m}^2$  Zone 3 Zone 2 Zone 1
